MODELO OPERACIONAL E ESCALABILIDADE

Como operar múltiplos Planos de Evolução sem transformar os sócios no gargalo da empresa

---

1. Objetivo

Este documento define como a empresa deve estruturar sua operação para administrar um número crescente de projetos de Evolução Contínua.

O objetivo organizacional é:

> **Retirar progressivamente os sócios da execução operacional e colocá-los nas funções de controle, estratégia e tomada de decisão.**

Isso não significa que os sócios deixam de conhecer os projetos.

Significa que a empresa deve funcionar sem depender da participação direta dos sócios em:

- cada reunião;
- cada entrega;
- cada tarefa;
- cada cobrança;
- cada decisão técnica;
- cada conversa com desenvolvedor.

---

2. Situação Atual

Sócios

Atualmente a empresa possui quatro sócios:

- Marina;
- Michel;
- João;
- Otávio.

Os sócios ainda possuem participação significativa na operação.

Marina e Michel possuem forte participação operacional.

Otávio possui maior atuação financeira.

João possui maior atuação em relacionamento, podendo apoiar outras áreas quando necessário.

---

3. Projetos Atuais

Atualmente existem nove projetos:

1. Thinqi
2. Bruno Marketing
3. Master
4. LowTax
5. R Jhonson
6. Amparos
7. Dunas
8. Quality
9. Abracs

---

4. Desenvolvimento Atual

A equipe de desenvolvimento mencionada atualmente possui:

- João Biblioteca;
- João n8n.

João Biblioteca está envolvido em:

- Thinqi;
- LowTax;
- Quality;
- Abracs.

Marina e Michel estão diretamente envolvidos em:

- Master;
- R Jhonson;
- Bruno Marketing.

Isso demonstra que a empresa já possui dois possíveis pontos de concentração:

Concentração técnica

Um único desenvolvedor envolvido em quatro projetos.

Concentração de gestão

Sócios diretamente envolvidos na operação de múltiplos projetos.

---

5. Problema de Escalabilidade

Com poucos projetos, o modelo atual funciona.

Um sócio consegue:

- participar da reunião;
- conversar com cliente;
- organizar escopo;
- acompanhar desenvolvedor;
- conferir entrega;
- resolver problemas.

Entretanto, esse modelo não escala.

Se a empresa chegar a:

- 10 projetos;
- 20 projetos;
- 30 projetos;
- 50 projetos;

não será possível que os quatro sócios continuem acompanhando diretamente todas as operações.

Portanto:

> **A escalabilidade não depende apenas da contratação de mais desenvolvedores. Depende da criação de camadas de responsabilidade e de um sistema de governança.**

---

6. Princípio Organizacional

A organização deve seguir:

```
SÓCIOS
  ↓
GESTÃO
  ↓
LIDERANÇA TÉCNICA
  ↓
EXECUÇÃO
```


Cada nível possui responsabilidades diferentes.

A informação deve subir de maneira consolidada.

As decisões devem descer de maneira estruturada.

7. Estrutura Organizacional Desejada

No futuro, uma estrutura possível é:

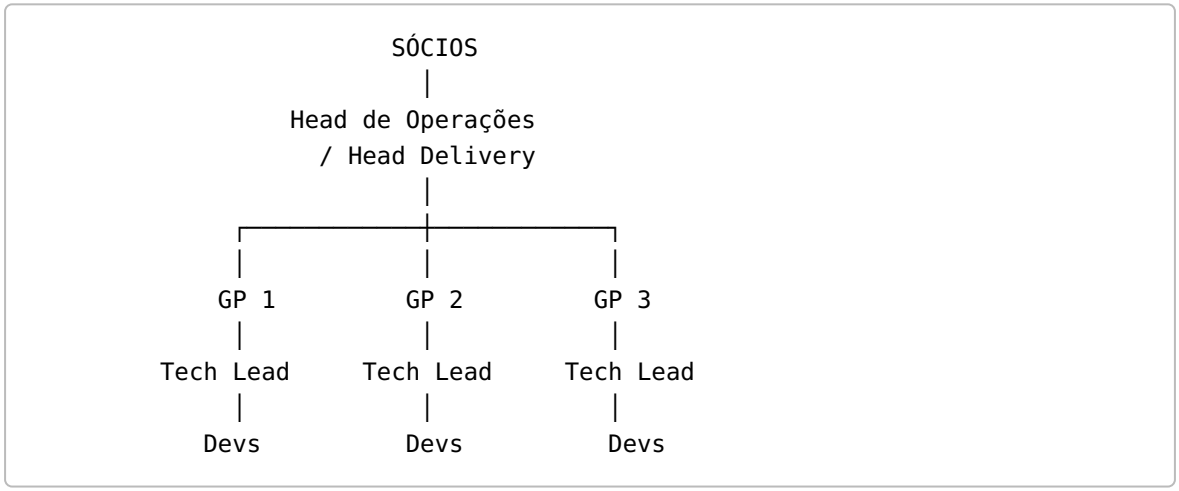

Os nomes dos cargos podem mudar.

O importante são as responsabilidades.

8. Papel dos Sócios

O objetivo é que os sócios atuem cada vez mais em:

- estratégia;
- vendas;
- grandes negociações;
- contratação;
- capital;
- definição de processos;
- acompanhamento financeiro;
- expansão;
- parcerias;
- grandes decisões;
- gestão dos líderes;
- acompanhamento do portfólio.

Os sócios não devem ser responsáveis permanentemente por:

- cobrar tarefa;
- atualizar backlog;
- marcar reunião;
- perguntar ao desenvolvedor se algo ficou pronto;
- organizar cada entrega;
- participar de toda reunião com cliente.

---

9. Dono Operacional do Projeto

Todo projeto deve possuir **exatamente um responsável operacional**.

Esse responsável pode receber o nome de:

- Project Manager;
- Delivery Manager;
- Evolution Manager;
- GP.

Para a metodologia própria da empresa, o termo sugerido é:

Evolution Manager

A regra é:

> **Todo projeto possui um Evolution Manager responsável pela saúde operacional daquele projeto.**

Não deve existir:

> "Marina e Michel são responsáveis."

Pode existir participação conjunta.

Mas a responsabilidade precisa estar atribuída a uma pessoa.

---

10. Responsabilidades do Evolution Manager

O Evolution Manager é responsável por:

- relacionamento operacional com cliente;
- reuniões;
- levantamento contínuo de requisitos;
- backlog;
- prioridades;
- planejamento dos ciclos;
- acompanhamento das entregas;
- prazos;
- documentação;
- bloqueios;
- riscos;
- comunicação;
- demonstrações;

- feedback;
- status do projeto;
- organização do próximo ciclo.

Ele é a ponte entre:

```
CLIENTE
   ↕
EVOLUTION MANAGER
   ↕
EQUIPE TÉCNICA
```

---

11. O Evolution Manager não é um mensageiro

Um erro seria contratar alguém cuja função seja:

1. perguntar ao desenvolvedor como está;
2. copiar a resposta;
3. mandar para o sócio.

Isso não cria gestão.

O Evolution Manager precisa possuir responsabilidade sobre o resultado operacional.

Exemplo ruim:

> "O João atrasou."

Exemplo esperado:

> "Identificamos risco de atraso na terça-feira. Repriorizamos o ciclo, retiramos o item B, mantivemos a entrega crítica A e alinhamos a nova previsão com o cliente."

O Evolution Manager deve resolver problemas dentro da sua autonomia.

Somente decisões que excedam essa autonomia devem subir.

---

12. Tech Lead

À medida que o número de desenvolvedores crescer, surge a necessidade de liderança técnica.

O Tech Lead é responsável por:

- arquitetura;
- padrões técnicos;

- decisões de implementação;
- revisão;
- qualidade;
- distribuição técnica;
- mentoria;
- desbloqueio dos desenvolvedores;
- dívida técnica;
- segurança técnica;
- estimativas.

A divisão fundamental é:

Evolution Manager

> Estamos construindo a coisa certa?

Tech Lead

> Estamos construindo da maneira certa?

---

13. Desenvolvedor

O desenvolvedor deve conseguir concentrar sua energia principalmente em execução.

Ele recebe:

- prioridade;
- contexto;
- requisito;
- critérios de aceite;
- orientação técnica.

E entrega software.

Quanto mais a empresa cresce, menos desejável é que desenvolvedores sejam responsáveis também por:

- gestão do cliente;
- organização comercial;
- cobrança;
- priorização estratégica;
- administração do contrato.

---

14. Estrutura de Comunicação

O modelo deve evitar:

```
Sócio
 ↓
GP
 ↓
Tech Lead
 ↓
Dev

MAS...

Sócio também chama o Dev
Sócio também chama o cliente
Cliente também chama o Dev
Outro sócio também chama o Tech Lead
```

Isso destrói a hierarquia operacional.

O fluxo esperado é:

```
SÓCIOS
   ↕
HEAD DE DELIVERY
   ↕
EVOLUTION MANAGERS
   ↕
TECH LEADS
   ↕
DEVS
```

Isso não significa proibir comunicação.

Significa definir **responsabilidade e fluxo de decisão**.

---

15. Gestão por Exceção

O principal mecanismo para retirar os sócios da operação é a **Gestão por Exceção**.

Os sócios não precisam investigar continuamente projetos saudáveis.

Todo projeto recebe um status:

🟢 Verde

Operação normal.

🟡 Amarelo

Existe risco que merece atenção.

🔴 Vermelho

Existe problema relevante ou decisão superior necessária.

O objetivo é permitir que os sócios concentrem atenção nos amarelos e principalmente nos vermelhos.

---

16. Painel de Portfólio

Deve existir uma visão consolidada:

Projeto	Responsável	Saúde	Capacidade	Entrega	Cliente
Thinqi	GP A	🟢	75%	95%	🟢
Bruno Marketing	GP B	🟢	82%	100%	🟢
Master	GP B	🟡	95%	85%	🟢
LowTax	GP A	🟢	70%	100%	🟢
R Jhonson	GP B	🟡	90%	90%	🟡
Amparos	GP C	🟢	65%	100%	🟢
Dunas	GP C	🟢	60%	100%	🟢
Quality	GP A	🔴	110%	70%	🟡
Abracs	GP A	🟢	75%	95%	🟢

Os valores acima são apenas exemplos.

---

17. Reunião de Portfólio

Os sócios devem possuir uma reunião recorrente de portfólio.

Sugestão inicial:

30 a 45 minutos por semana.

Objetivo:

> Identificar riscos e tomar decisões.

Não é objetivo:

> Discutir cada tarefa de cada projeto.

Estrutura:

1. Quantos projetos estão verdes?

2. Quantos estão amarelos?

3. Quantos estão vermelhos?

4. Existe problema de capacidade?

5. Existe problema financeiro?

6. Existe cliente insatisfeito?

7. Existe contratação necessária?

8. Existe decisão que precisa dos sócios?

Projetos verdes devem consumir pouco tempo.

Projetos vermelhos recebem atenção.

---

18. Controle do Evolution Manager

A delegação cria uma pergunta:

> Como garantir que o Evolution Manager esteja gerenciando corretamente?

A resposta deve combinar três mecanismos.

18.1 Indicadores

Exemplo:

Indicador	Resultado
Entregas no prazo	94%
Satisfação	9,1
Projetos verdes	4/5
Reuniões realizadas	100%

Indicador	Resultado
Documentação atualizada	100%
Desvio de capacidade	+4%

---

19. Voz Direta do Cliente

A empresa não deve depender exclusivamente da percepção do Evolution Manager.

Periodicamente, o cliente pode responder:

> De 0 a 10, como você avalia a evolução do projeto?

E:

> Existe alguma preocupação que a direção deveria conhecer?

Essa informação deve chegar à empresa independentemente do GP.

---

20. Auditoria Amostral

Os sócios não precisam participar de todas as reuniões.

Entretanto, podem realizar auditorias amostrais.

Periodicamente alguns projetos são selecionados.

Podem ser analisados:

- backlog;
- documentação;
- entregas;
- comunicação;
- código;
- satisfação;
- planejamento.

Eventualmente um sócio pode participar de uma reunião.

O objetivo é **auditar o sistema**, não voltar a executar a operação.

---

21. Capacidade dos Desenvolvedores

Número de projetos não é suficiente para medir carga.

Exemplo:

João Biblioteca está atualmente em:

- Thinqi;
- LowTax;
- Quality;
- Abracs.

Isso não significa automaticamente sobrecarga.

É necessário medir capacidade.

Exemplo:

Projeto	Alocação
Thinqi	30%
LowTax	20%
Quality	20%
Abracs	10%
Reserva	20%
Total	**100%**

Outro cenário:

Projeto	Alocação
Thinqi	40%
LowTax	30%
Quality	30%
Abracs	20%
Total	**120%**

O segundo cenário representa sobrecarga.

---

22. Reserva de Capacidade

Não é recomendável planejar continuamente 100% da capacidade produtiva.

Deve existir espaço para:

- bugs;
- suporte;
- reuniões;
- imprevistos;
- revisão;
- pequenas urgências.

A meta operacional pode ser calibrada com dados reais.

Inicialmente, pode ser testada uma utilização planejada abaixo da capacidade máxima e ajustada conforme a empresa aprende.

---

23. Complexidade dos Projetos

Um erro seria definir:

> 1 GP = 5 projetos.

Projetos possuem complexidades diferentes.

Um projeto pode possuir:

- 1 desenvolvedor;
- reunião quinzenal;
- poucos stakeholders.

Outro pode possuir:

- 6 desenvolvedores;
- hardware;
- integrações;
- cliente corporativo;
- reuniões semanais;
- múltiplos stakeholders.

Portanto deve existir uma medida de **Complexidade de Gestão**.

---

24. Unidades de Gestão

Exemplo inicial:

Projeto simples

1 unidade

Projeto médio

2 unidades

Projeto complexo

4 unidades

Pode-se definir, por exemplo, que um Evolution Manager suporta inicialmente até determinada quantidade de unidades.

Assim ele poderia administrar:

Cenário A

8 projetos simples.

Cenário B

4 projetos médios.

Cenário C

2 complexos.

Cenário D

1 complexo + 2 médios.

Os limites devem ser calibrados com experiência real.

---

25. Fatores de Complexidade

A complexidade pode considerar:

- quantidade de desenvolvedores;
- frequência de reuniões;
- quantidade de stakeholders;
- criticidade;
- quantidade de integrações;
- hardware;
- volume de requisitos;
- velocidade de mudança;
- necessidade de documentação;

- exigências regulatórias;
- tamanho do cliente.

---

26. Escalabilidade por Células

A empresa pode futuramente organizar a operação através de células.

```
CÉLULA A

Evolution Manager
        │
   Tech Lead
        │
  ┌─────┼─────┐
Dev   Dev   Dev
```

```
CÉLULA B

Evolution Manager
        │
   Tech Lead
        │
  ┌─────┼─────┐
Dev   Dev   Dev
```

Recursos como:

- design;
- QA;
- DevOps;
- dados;

podem inicialmente ser compartilhados.

---

27. Quando Criar uma Nova Célula

Uma nova célula não deve ser criada apenas quando todos estiverem completamente sobrecarregados.

Indicadores devem antecipar a necessidade.

Exemplos:

- capacidade técnica consistentemente acima da meta;
- GPs próximos do limite;

• queda no percentual de entregas;
• aumento de bugs;
• queda na satisfação;
• excesso de horas;
• backlog crescendo mais rápido que a entrega;
• novos contratos assinados sem capacidade disponível.

---

28. Evolução Organizacional

Fase 1 — Sócios na Operação

Situação inicial.

```
Sócios
 ↓
Projetos
 ↓
Devs
```

É útil para entender profundamente o processo.

Mas não é escalável.

Fase 2 — Primeira Delegação

```
Sócios
 ↓
Evolution Manager
 ↓
Projetos
 ↓
Devs
```

Os sócios começam a sair da gestão diária.

Fase 3 — Liderança Técnica

```
Sócios
 ↓
Evolution Manager
 ↓
Tech Lead
```

```
 ↓
Devs
```


A gestão operacional e a gestão técnica ficam separadas.

Fase 4 — Gestão de Portfólio

```
Sócios
 ↓
Head de Delivery
 ↓
Evolution Managers
 ↓
Tech Leads
 ↓
Devs
```

Os sócios passam a administrar líderes.

Fase 5 — Escala

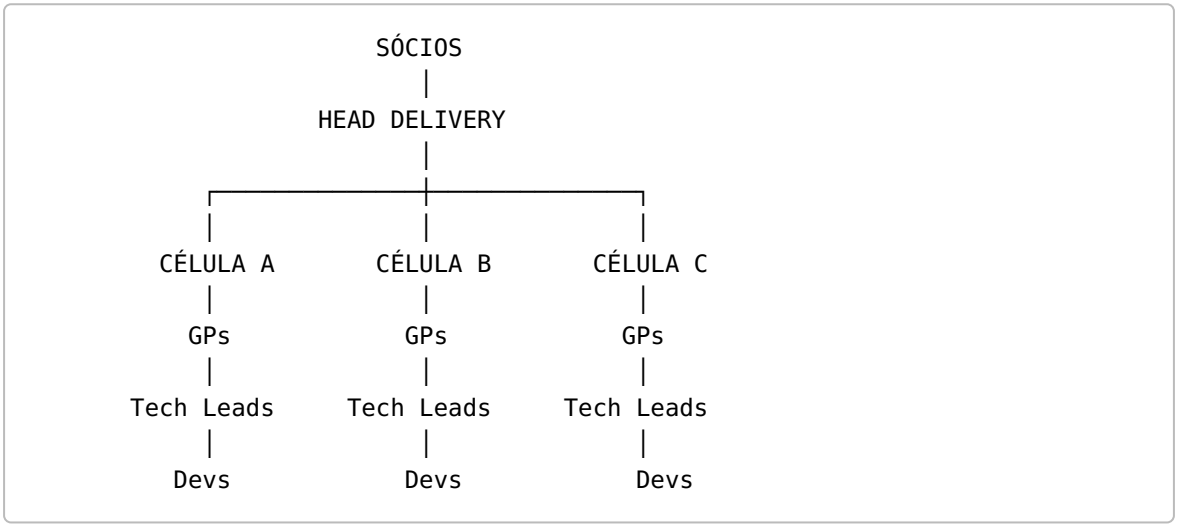

A empresa passa a possuir uma estrutura replicável.

---

29. Regra de Escalonamento

Nem todo problema deve chegar aos sócios.

Deve existir uma matriz de autonomia.

Desenvolvedor resolve

- decisões simples de implementação;
- bugs comuns;
- tarefas técnicas.

Tech Lead resolve

- arquitetura;
- conflitos técnicos;
- estimativas;
- distribuição técnica;
- qualidade.

Evolution Manager resolve

- prioridade;
- planejamento;
- comunicação;
- pequenos atrasos;
- alinhamento com cliente.

Head de Delivery resolve

- conflitos entre projetos;
- capacidade;
- realocação;
- problemas graves;
- performance dos GPs.

Sócios resolvem

- grandes riscos;
- contratos;
- contratações estratégicas;
- grandes conflitos;
- investimento;
- mudança de estratégia;
- clientes críticos;
- decisões financeiras relevantes.

---

30. Gate Comercial

A empresa não deve vender um projeto sem verificar capacidade.

Fluxo:

```
OPORTUNIDADE
     ↓
```

```
QUALIFICAÇÃO
    ↓
ANÁLISE TÉCNICA
    ↓
ESTIMATIVA DE CAPACIDADE
    ↓
ESTIMATIVA DE CUSTO
    ↓
MARGEM
    ↓
CAPACIDADE DISPONÍVEL?
    ↓
APROVAÇÃO
    ↓
CONTRATO
```

A venda precisa conversar com a operação.

---

31. Capacidade Antes da Venda

Antes de assinar um novo Plano de Evolução devem ser respondidas:

- Quem será o Evolution Manager?
- Existe capacidade de gestão?
- Quem será o responsável técnico?
- Existem desenvolvedores disponíveis?
- Quantas horas/unidades serão necessárias?
- Qual é o custo?
- Qual é a margem?
- Precisaremos contratar?
- Quando a equipe estará disponível?

---

32. Sistema Operacional Interno

A empresa deve possuir uma fonte única de verdade para a operação.

Inicialmente isso pode ser implementado utilizando ferramentas existentes.

Posteriormente, caso exista benefício claro, pode ser criado um ERP/sistema interno próprio.

O sistema deve responder rapidamente:

- quantos projetos existem;
- quem responde por cada um;
- quem desenvolve;
- capacidade de cada pessoa;

- próxima reunião;
- próxima entrega;
- backlog;
- bloqueios;
- saúde;
- margem;
- satisfação;
- riscos.

---

33. Visões do Sistema

Sócios

Precisam ver:

- portfólio;
- receita;
- margem;
- capacidade;
- saúde;
- riscos;
- contratações;
- decisões.

Head de Delivery

Precisa ver:

- todos os projetos;
- GPs;
- capacidade;
- bloqueios;
- riscos;
- performance.

Evolution Manager

Precisa ver:

- clientes;
- reuniões;
- backlog;
- entregas;
- prioridades;
- documentação;
- riscos.

Tech Lead

Precisa ver:

- arquitetura;
- tarefas;
- desenvolvedores;
- bugs;
- qualidade;
- bloqueios técnicos.

Desenvolvedor

Precisa principalmente saber:

> O que preciso fazer agora?

---

34. Princípio de Informação

> **Cada nível deve receber a quantidade de informação necessária para tomar as decisões daquele nível.**

O desenvolvedor não precisa acompanhar a margem financeira do contrato para executar uma tarefa.

O sócio não precisa acompanhar cada componente técnico.

Entretanto, se um problema técnico gerar risco financeiro ou operacional relevante, essa informação precisa subir.

---

35. Objetivo Final

A empresa precisa sair de:

```
CLIENTE
   ↓
SÓCIO
   ↓
DEV
```

para:

```
CLIENTE
   ↓
EVOLUTION MANAGER
```

```
   ↓
TECH LEAD
   ↓
DEV

          ↑

HEAD DE DELIVERY

          ↑

SÓCIOS
```

Os sócios passam a controlar:

- pessoas;
- indicadores;
- capital;
- processos;
- estratégia;
- crescimento.

---

36. A pergunta que define a escalabilidade

A pergunta não deve ser:

> "Quantos projetos os quatro sócios conseguem acompanhar?"

Essa pergunta cria um teto inevitável.

A pergunta correta é:

> **"Quantos projetos o nosso sistema operacional consegue administrar mantendo qualidade, margem e satisfação sem aumentar proporcionalmente a participação dos sócios?"**

---

37. Princípio Final

Delegar não significa perder controle.

A empresa precisa substituir:

> **controle através da presença dos sócios**

por:

controle através de processos, responsáveis, indicadores, auditoria e gestão por exceção.

O objetivo final é construir uma organização em que os sócios consigam observar o funcionamento da empresa, identificar problemas e tomar decisões sem precisar executar diariamente cada projeto.

A empresa deixa de depender dos sócios para **funcionar** e passa a depender deles principalmente para **decidir para onde crescer**.
